



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

"2019 - Año del Centenario Del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

NOTA Nº 15 7/2019.-

LETRA: MUN.U

USHUAIA, 07 OCT 2019

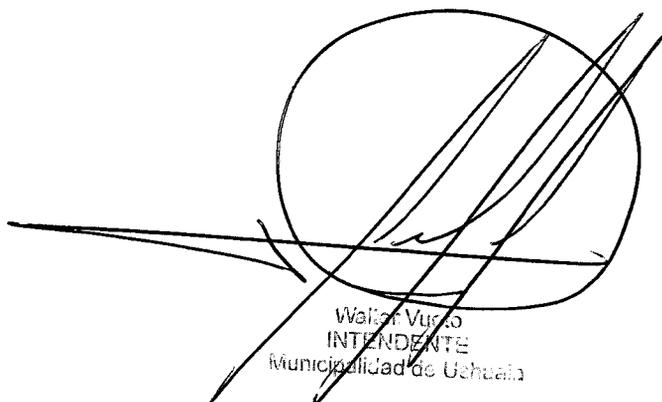
SR. PRESIDENTE:

Me dirijo a Usted, en relación a la Resolución 331 del año 2019.

Respecto de la misma, para dar respuesta a lo solicitado por el cuerpo de concejales, adjunto informe D.E. y P.N. 32/2019, adjuntado a la nota 251/2019 letra S.P. e I.P.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.-

CONCEJO DELIBERANTE	
MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA	
ASUNTOS INGRESADOS	
Fecha: 10/10/19	Nº: 947
Numero: 948	Fojos: 5
Expte. Nº	
Girado:	
Recibido:	

  
Walter Vucso  
INTENDENTE  
Municipalidad de Ushuaia

SEÑOR PRESIDENTE  
CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE USHUAIA  
Dn. Juan Carlos PINO

S / D



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
Municipalidad de Ushuaia

2019 – Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

NOTA N°251/2019.-

LETRA: S.P. e I.P.-

USHUAIA, 30 de Septiembre de 2019.

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

Marcos MEYER

Por medio de la presente a los fines de dar respuesta a la Resolución C.D. N° 331/2019 adjunto informe D.E. y P.N. N° 32/2019 Ref: Exp. O.P. N° 10447/2018 – “Remodelación Plaza Libertador General José de San Martín”.

  
Dr. Pablo Gabriel CASTRO  
Subsecretario de Obras Publicas  
S.S.O.P.  
Municipalidad de Ushuaia  
A/c S.P.e I.P.



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
-REPÚBLICA ARGENTINA-  
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2019 – Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

Ref.: Expte. OP-10447/2018 - Remodelación  
Plaza Libertador General José de San Martín


Sr. Director de Obras A/C  
Arq. Hugo Subiabre:

Por medio del presente, en respuesta a lo solicitado en Resolución CD N.º 331/2019, le informo:

- a) Monto de obra: PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS (\$ 8.383.633,00).  
Plazo de Obra: CUARENTA Y CINCO (45) días corridos.
- b) Empresa Constructora: VARGAS ENRIQUE ROBINSON.
- c) Al día de la fecha se han ejecutado el 100 % de las tareas preliminares, aproximadamente un 40 % de los movimientos de suelos, aproximadamente un 90 % de las demoliciones y retiros, un 20 % de la instalación eléctrica, se está realizando la ejecución de solados, estimándose un avance aproximado del 30 %, restando ejecutar la totalidad de la pintura y la provisión y colocación de equipamiento.
- d) Actualmente la obra se encuentra con los plazos suspendidos por veda invernal, los mismos se reanudarán el 1 de octubre. Cabe destacar que se permitió a la empresa la ejecución de trabajos siempre que las condiciones climáticas así lo permitan. Se estima que la fecha de finalización de la obra será el 14 de octubre de 2019.
- e) Al día de la fecha la empresa no ha solicitado redeterminación de precios.

Sin más lo saludo atentamente.

**INFORME D.E y P. N.º 32/19**  
Ushuaia, 26 de septiembre de 2019



Arg. Pablo A. Pacheco  
Dpto. Arquitectura D. E. y P.  
Municipalidad de Ushuaia

Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

Levo para su conocimiento el INF.D.E. y T. N° 32/19  
elaborado por el Inspector de la obra de referencia.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  
**RECIBO**  
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN e INVERSIÓN PÚBLICA

27 SET. 2019

Hora:

Firma:  Legajo: 3738

Arq. SUBIABRE Migo  
Jefe División Trabajos en Vía Pública  
D.O. Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia, 27/09/19.-  
A/c D.O.

“Años del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”.



Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Ushuaia

NOTA N° 547 /2019.-  
LETRA: C.y D. -----  
REF: EXPTE.51/2017.-

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	
Div. M.E. y S.S.G.	
NOTA REGISTRADA N°	05665
FECHA	9 SEP 2019 HORA 9:00
RECIBIDO POR	<i>[Signature]</i>

USHUAIA,

18 SEP 2019

Señores  
Mesa de Entrada y Salida  
del Departamento Ejecutivo Municipal  
S / D.-

Se remite adjunta la Resolución CD N° 331 /2019, dada en la 6° sesión ordinaria, correspondiente a la fecha 11 de septiembre de 2019, por medio de la cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, informe a este Cuerpo sobre la obra de refacción de la plaza General San Martín, ubicada en la intersección de avenida Maipú y calle Remolcador Guaraní.

*[Signature]*  
Nancy Patricia PEREZ  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

Director de Obras

Re: to que con todo lo solicitado por  
nota de esa Dirección

~~SCOTTO Javier Nicolás~~  
Div. Seg. de Gestión  
Adm. Dir. de Políticas  
Municipalidad de Ushuaia

RECIBIDA  
24-09-2019  
14:30/4

*[Signature]*  
Dra. Gabriela MÚNIZ SICCARDI  
Secretaría de Planificación e  
Inversión Pública  
S.P. e. P.  
Municipalidad de Ushuaia

24-9-19



*EL CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE USHUAIA  
RESUELVE*

ARTÍCULO 1°.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, informe a este Cuerpo sobre la obra de refacción de la plaza General San Martín, ubicada en la intersección de avenida Maipú y calle Remolcador Guaraní, de acuerdo al siguiente detalle:

- a) monto y plazo de ejecución de la obra;
- b) empresa a cargo de la obra;
- c) detalle de avance en los trabajos a la fecha;
- d) fecha prevista para la reanudación de los trabajos tras la veda invernal y fecha estimada de finalización;
- e) si la empresa a cargo de la obra ha interpuesto a la fecha, reclamo y/o solicitud de reconocimiento de mayores costos al Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.

RESOLUCIÓN CD N.º **331** /2019.-

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11/09/2019.-

fc




E. ALEJANDRO BEROLA  
Secretario Legislativo  
Concejo Deliberante Ushuaia




Juan Carlos RINO  
Presidente  
Concejo Deliberante de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
Patricia PEREZ  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

Pase al Inspector de obras, para elaborar  
el presente informe.

A/c. D.O. 

Arq. SUBIABRE Hugo F.  
Jefe División Trabajos en Vía Pública  
D.O. Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia, 25/09/19. —
